गंगादेवगाउँपालिका


गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

सानडाँडा, रोल्पा

लुम्बिनीप्रदेश नेपाल

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक

प्रगति प्रतिवेदन

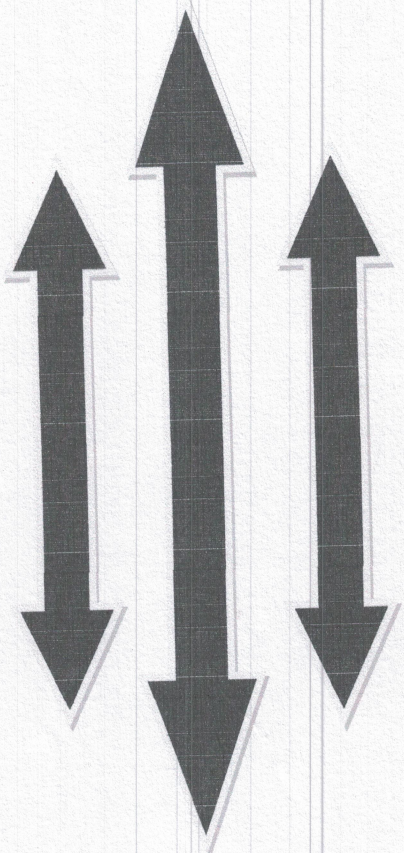

योजना शाखा

गंगादेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सानडाँडा, रोल्पा

लुम्बिनी प्रेदश नेपाल

२०७३

१. आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक सम्म मा सम्झौता भई काम शुरु भएका योजनाहरुको विवरण:

आ .व.2079/080 मा हाल सम्म सम्झौता भई काम शुरु भएका योजनाहरु									
क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौतामिति	लागत	कुललागत	अध्यक्षकोनाम	मोबाइलनं.	योजनासुरु हुने मिति	योजनासम्पन्न हुने मिति	कैफियत
१	काफलचौरसिंचाई पोखरी निर्माण	१	2079-09-03	215000.00	240151.13	पल बहादुर डाँगी	9765410660	2079-09-04	2079-12-25	वडा
2	कुयापानीहुँदै गैरेनी तामाखानी सम्म मोनिर्माण .वा.	३	2079-08-18	100000.00	110948.10	तिलकराज वली	9843355350	2079-08-20	2079-09-05	वडा
3	नेपाल राष्ट्रिय प्राभवन .वि. मर्मत	७	2079-08-20	500000.00	626184.97	लक्ष्मी प्रकाश वली	9812891263	2079-08-21	2079-11-20	वडा
4	बल्लेसिमा खानेपानी निर्माण	६	2079-09-04	200000.00	226587.98	उज्जन राना	9768583012	2079-09-10	2079-11-25	वडा
5	तल्लो मग्रा गाउँ मोटर बाटो निर्माण	३	2079-09-17	150000.00	167755.30	पदम बहादुर वली	9844981148	2079-09-25	2079-10-15	वडा
6	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार गणेश आवि बडाढुङ्गा ४ कोठे भवन निर्माण	३	2079-09-04	5000000.00	5653655.19	पल बहादुर डाँगी	9844978827	2079-09-15	2080-02-15	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार का
7	सिलाजुपुछर देखि दोवाट खा पा निर्माण	१	2079-09-17	350000.00	401655.31	नवल सिं डाँगी	9843977084	2079-09-19	2079-10-25	वडा
8	भाँगोछरे गोठीखोला २ वटा पक्की पुल निर्माण	१	2079-09-03	240000.00	266289.27	टिका कुमारी डाँगी	9866906939	2079-09-04	2079-10-08	वडा
9	कृष्णआवि घरविर भवन मर्मत कार्यक्रम	२	2079-09-18	400000.00	444888.45	तारा प्रसाद घर्तिमगर	9829595501	2079-09-21	2079-11-29	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार
१०	गोठीखोलालिस्नेपुछार पक्की पुल निर्माण	२	2079-09-19	200000.00	223270.40	शिव बहादुर भण्डारी	9844177489	2079-09-25	2079-11-15	वडा

११	वडानंका सहायक मोटर ४ . बाटो मर्मत	४	2079-07-23	1348000.00	1493460.50	कमल प्रकाश वली	9845454632	2079-07-24	2079-09-25	गापा वडा नं .का सहायक मर्मत कार्यपालिकाको मिति को निर्णयबमोजि
१२	राष्ट्रियमाकोठे २मेलडारी .वि. भवन निर्माण	१	2079-09-19	2500000.00	2842656.41	खगेन्द्र वली	9864331426	2079-09-25	2080-02-25	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्य
१३	6 नंवडाको सहायक बाटो . मर्मत	६	2079-07-24	1005000.00	1116350.74	मुन बहादुर खड्का	9812477445	2079-07-25	2079-09-25	गापा वडा नं .6 का सहाय मर्मत कार्यपालिकाको मि को निर्णयबमोजि
१४	सुकिदह शिव गुफा तथा मठमन्दिर पर्यटन पूर्वाधार	२	2079-09-20	800000.00	887257.86	खकेन्द्र भण्डारी	9868605491	2079-09-25	2079-11-25	संघीयसरकार शसर्त अनुदान
१५	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बुद्धि विकास मा .वि. कोठे ४भवन निर्माण	६	2079-09-20	5000000.00	5653655.19	राजेन्द्र खडुका	9847953452	2079-09-21	2080-02-25	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्य
१६	गैरीखर्क जहेले मोटर बोटो निर्माण	३	2079-09-24	150000.00	166171.20	मान बहादुर वली	9810899745	2079-09-25	2079-10-18	वडा
१७	जनविकासप्रावि नेटापरी 2 कोठे भवन निर्माण	६	2079-09-25	2500000.00	2781619.12	कल बहादुर वली	9844968793	2079-09-25	2080-02-20	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्य
18	अमरसत्य प्रावि २ कोठे भवन निर्माण	६	2079-09-25	2500000.00	2781619.12	कमान सिं खत्रि	9748719821	2079-09-25	2080-02-20	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्य
19	इन्द्रसेवकप्रापङ्गाहाले भवन .वि. मर्मत	४	2079-09-25	1000000.00	1113781.58	कल बहादुर खत्री	9847885202	2079-09-26	2079-12-02	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार
२०	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्यक्रम जिवन ज्योति मा .वि.4 कोठे भवन निर्माण	६	2079-09-26	5000000.00	5653655.19	खिम बहादुर खड्का	9822865995	2079-10-04	2080-03-10	राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार का
२१	सरस्वतीमाबल्लेपोखरी .वि.	६	2079-09-25	1100000.00	1228869.91	हेमन्त प्रसाद राना	9841316939	2079-09-26	2079-12-30	राष्ट्रिययोजना आयोग

	विद्यालय घेरबार ६रांगादेव								
२२	बालविकासकेन्द्र भवन मर्मत गौरामाथि	४	2079-09-25	170000.00	190743.26	महेन्द्र प्रकाश वली	9844888862	2079-09-26	2079-10-25	वडा
२३	सिर्जशिलमहिला आमा समुह भवन निर्माण	२	2079-09-25	200000.00	221364.75	देवसरा वली	9812817165	2079-09-25	2079-10-28	वडा
२४	चाखलेपातलनाउली हुदै ओत सम्म मोमर्मत .बा.	३र १	2079-07-24	1330000.00	1471902.15	चन्द्र बहादुर डाँगी	9866872636	2079-07-26	2079-08-29	गा पा का सबै मो बा सफा 2079/06/06 को कार्यपालिक
२५	ठारापानी लिफ्ट खानेपानी पाइप खरिद	४	2079-08-28	170000.00	188359.92	नन्द बहादुर वली	9822160610	2079-09-01	2079-10-05	वडा
२६	सरस्वतीमाम्बालेखोला .वि. फिल्ड निर्माण	४	2079-10-05	2000000.00	2221646.01	नारायण वली	9866173458	2079-10-06	2079-11-20	शसर्त अनुदान प्रदेश सरका
27	हाँसीकाटे चामी खामर्मत .पा.	३	2079-09-04	50000.00	55899.76	एकराज के.सी.	9857821675	2079-09-07	2079-10-15	वडा
२८	जनताविकास आफिल्ड .वि. र्माण तथा धाराखोला ड्राइवाल निर्माण	४	2079-09-25	500000.00	505910.71	प्रशाराम डाँगी	986498278	2079-09-26	2080-01-10	प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्र
२९	सिरडेडाँडा मोरठ चौफारी घरविर चौतारा डाँडागाउँ चौकाबाङ चौतारविद्यालय, बौलाचौर डाँडागाउँ घरविर लामाचौर घोनिर्माण .बा.	२	2079-09-26	550000.00	556970.87	खगेन्द्र के.सी.	9842332690	2079-09-27	2080-01-10	प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्र

२. आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्मकाम सम्पन्न भएको र योजनाहरु अनुगमन भइ भुक्तानी समेत भइसकेका योजनाहरुको विवरण:

काम सम्पन्न भएको र अनुगमन भई भुक्तानी समेत भएका योजनाहरु

क.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौतामिति	लागत	कुललागत	अध्यक्षकोनाम	भुक्तानी रकम	योजनासुरु भएको मिति	योजनासम्पन्न भएको मिति	कैफियत
१	छिचिकोटेझ्याम सुखाओडार जायाचौर ताप्ला सम्म मो बा मर्मत	३,२,७ र ६	2079-07-16	1680000.00	1861298.13	रमेश खत्री	1588608	2079-07-17	2079-08-10	काम सम्पन्न भइ भुक्तानी भइ
२	फारुलालोदचौर हुदै मालेखोला सम्म मो बा मर्मत	२,५ र ४	2079-07-24	1350000.00	1497515.33	कमला डाँगी वली	1276560	2079-07-24	2079-08-28	गा पा का सबै मो बा सफाई 2079/06/06 को कार्यपालिका
३	देउतीमन्दिर निर्माण	१	2079-08-29	115000.00	128047.94	मोहन वली	108744	2079-09-01	2079-09-25	वडा

३. गत आ.व. २०७८/०७९ मा काम सम्पन्न भएका र यस वर्ष अल्याबाट भुक्तानी भएका योजनाहरुको विवरण:

क.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौतामिति	लागत	कुललागत	भुक्तानी रकम	योजनासुरु भएको मिति	योजनासम्पन्न भएको मिति	कैफियत
१	स्वास्थ्य चौकी तथा वडा नं. ४ मर्मत	४	२०७८/०७९	२०००००	207574	१७६७३७	आ.व. २०७८/०७९ मा सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको		गत आ.व. को अल्याबाट भुक्तानी
२	नाउली आटीघर मो बा मर्मत	३	२०७८/०७९	१०००००	117887	९४५६०	आ.व. २०७८/०७९ मा सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको		गत आ.व. को अल्याबाट भुक्तानी
३	गंगादेव गा.पा. भरी मो.बा. मर्मत	१,२,३,४,५,६ र ७	२०७८/०७९	२०००००		६०००००	आ.व. २०७८/०७९ मा सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको		गत आ.व. मा १४००००० भुक्तानी भइ सकेको बाँकि रकम अपुग भई यो वर्ष अल्याबाट भुक्तानी गरिएको

४. आ.व. २०७९/०८० मा अमानतबाट काम गराई काम सम्पन्न भई भुक्तानी समेत भईसकेका योजनाहरुको विवरण:

क.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौतामिति	लागत	कुललागत	भुक्तानी रकम	योजनासुरु भएको मिति	योजनासम्पन्न भएको मिति	कैफियत

१	सुखाओडार मो.बा. ग्याविङ वाल निर्माण	२		98418.18	98418.18	७३०३९.७९		गत आ.व. को अल्याबाट भुक्तानी


५. आ.व. २०७८/०७९ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र नमूना विद्यालय निर्माणको लागि रकम विनियोजन भएका योजनाहरुको काम समयमा सम्पन्न नभएका र चालु आ.व. मा सम्पन्न भएका खाता फुकुवाको लागि अनुगमन गरिएका योजनाहरुको विवरण:

क्र.सं.	योजनाको नाम	कुल विनियोजन रकम	वडा नं.	अनुगमन भएको मिति	कामको अवस्था	कैफियत
१	सिद्धार्थ नमुना माध्यामिक विद्यालय ६ कोठे भवन निर्माण	९११२००२	३	2079/09/21	सम्पन्न	नमूना विद्यालय निर्माणबाट विनियोजित रकम
२	कृष्ण आ.वि. घरविर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	२	2079/09/22	सम्पन्न	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम
३	जनप्रेम आ.वि. सल्लीचौर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	६	2079/09/25	सम्पन्न	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम
४	जनविकास प्रा.वि. नेटापरी २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	६	2079/09/25	सम्पन्न	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम
५	अमर सत्य प्रा.वि. झुहल्नेटाकुरा २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	६	2079/09/26	सम्पन्न	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम
६	जीवनज्योती मा.वि. देउल टाकुरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	६	2079/09/27	सम्पन्न	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम

६. सारांशमा

क्र.सं.	आ.व. २०७९/०८० मा हाल सम्मका जम्मा योजना	सम्झौता भई काम शुरु भएका जम्मा योजना	काम सम्पन्न भएका अनुगमन भई भुक्तानी भएका जम्मा योजना	गत आ.व. का अल्या भुक्तानी जम्मा योजना	अमानतबाट काम गराई भुक्तानी भएका जम्मा योजना	सम्झौता हुन बाँकि योजनाहरु	गत वर्षका खाता फुकुवाको लागि अनुमगन गरिएका योजनाहरु
१	१३७	२९	३	३	१	१०४	६

उल्लेखित तालिकालाई पाई चार्ट बाट हेर्दा,

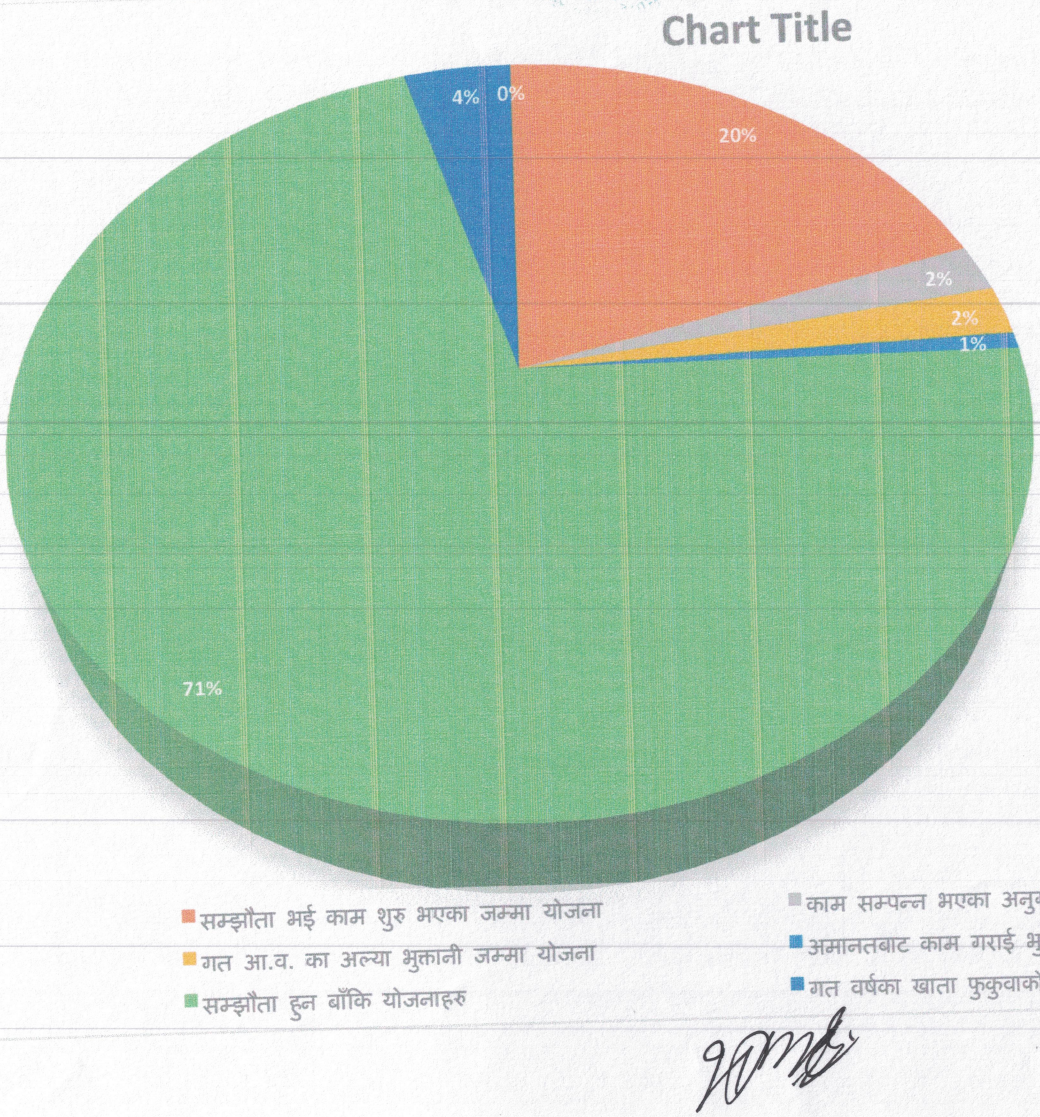

उल्लेखित पाईचार्ट अनुसार गंगादेव गाउँपालिकाको आ.व. 2079/080 मा दोस्रो त्रैमासिक सकिसक्दा सम्म जम्मा १३७ वटा योजनाहरुमा हाल सम्म २० प्रतिशत मात्र योजना सम्झौता भएको पाईयो भने ७१ प्रतिशत योजनाहरु अझै सम्झौता हुन बाँकी रहेका छन्। जस मध्ये माथिको पाईचार्ट अनुसार २ प्रतिशत योजना भुक्तानी भएको र अमानतबाट काम भएको योजना अन्तर्गत १ प्रतिशत रहेको मा सो योजनाको काम सम्पन्न भई भुक्तानी समेत भई सकेको छ। साथै गत आ.व. का अल्या योजनाहरुमा २ प्रतिशत प्रगति भएको पाइयो भने गत आ व का खाता फुकुवाको लागि अनुगमन गरिएका जम्मा ४ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

७. सल्लाह सुझावहरुः

- उल्लेखित प्रगति प्रतिवेदनलाई नियाल्दा पहिलो त्रैमासिकमा योजना सम्बन्धी कार्यहरु कुनै पनि नभएको देखियो भने दोस्रो त्रैमासिक सकिसक्दासम्म करिब २३ प्रतिशत काम अन्तर्गत योजना सम्झौता र भुक्तानीका काम भएको छ र सो कार्यलाई तेस्रो त्रैमासिक सम्म करिब ७० प्रतिशत सम्म लिनु पर्ने देखिन्छ अन्यथा भौतिक पूर्वाधारको काम यो आ.व. मा सम्पन्न गर्न धेरै सकस पर्ने देखिन्छ।
- वडामा रहेका वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधी लगायत कर्मचारीहरुलाई समेत योजना सम्झौताको लागि उपभोक्ता समितका पदाधिकारीहरुलाई ताकेता गर्न लगाई शिघ्र काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
- काममा कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध नआउनुका साथै योजना सम्बन्धी काम चुस्त, दुरुस्त र छीटो, छरितो हुनका लागि वडाको योजना अनुगमन समिति र पालिकाको योजना सुपरिवेक्ष तथा अनुगमन समितिले धेरै भन्दा धेरै अनुगमन गरि योजनाको कार्य सञ्चालनको लागि तिव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।
- योजना सम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक शाखाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा प्राविधिक शाखाबाट समेत तिव्र अनुगमन कार्य हुनु पर्ने देखिन्छ।
- योजनागत कार्य समयमै पूरा गर्न सकेमा पालिकाको विकासमा भौतिक पूर्वाधारले अहम भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुँदा यस विषयमा समग्र सरोकारवालहरु र पालिकाको तर्फ सबैबाट समेत सबैको ध्यान जान जरुरी देखिनछ।

८. निष्कर्षः

- समग्रमा आ.व. २०७९/०८० को योजनागत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनलाई हेर्दा सबै योजनाबाट २ प्रतिशत काम पूरा भएको छ। २० प्रतिशत योजनाहरु सम्झौता भई काम भैरहेको देखिन्छ भने अझै करिब ७१ प्रतिशत योजनाहरु सम्झौता गरि काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यस कार्यमा सबै सरोकारवालाहरु जुटी अगामी तेस्रो त्रैमासिक सम्ममा धेरै काम अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेद पेश गर्नेः
कुल बहादुर योगी
योजना शाखा प्रमुख

प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेः
शालिकराम बस्नेत
नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
